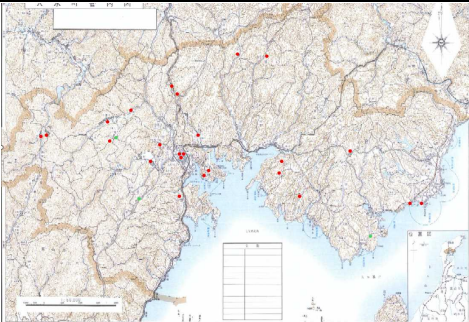


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		防火水槽	
位置図	地番		
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	23,325,000（被災時の推定被害額を記載）	円
	○対象施設 ・ 町内防火水槽（耐震性防火水槽含む） ○発災当初の状況 ・ 町内防火水槽（耐震性防火水槽含む） 公設防火水槽116基（内耐震性防火水槽55基）中、38基の防火水槽に 甚大な被害が生じた。		
被害状況詳細	・ 1 m以上の減水・・・・・・・・・・3基 ・ 1 m以下の減水・・・・・・・・・・11基 ・ 外構破損等・・・・・・・・・・19基→15基（下記理由により3基減、1基コンクリート天板ずれへ移動） ※穴水町字大町地内防火水槽（ブルート敷地内）にあっては、駐車場等の舗装工事に修繕。ブルートで対応で1基減 ※穴水町字中居南地内防火水槽（神杉保育園駐車場内）の再調査の結果、外構クラックが軽微で、消火活動及び貯水性能に問題がなかったため補修なしの為、1基減 ※穴水町字伊久留地内防火水槽（岡田酒店付近）の再調査の結果、外構に問題がなく隣接する道路の陥没で水溜まりが発生しており補修なしの為、1基減 ※穴水町字岩車地内防火水槽（石川県再資源化研究所）の再調査の結果、防火水槽コンクリート天板のずれのみであったため、外構破損等から防火水槽コンクリート天板ずれへ1基移動 ・ 防火水槽コンクリート天板ずれ・・・5基→8基（下記理由により3基追加） ※地区住民の要望により、防火水槽コンクリート天板ずれ修繕工事を行う。2基（山中（東山）、丸山地内）追加 ※穴水町字岩車地内防火水槽（石川県再資源化研究所）の再調査の結果、防火水槽コンクリート天板のずれのみであり、外構破損等から防火水槽コンクリート天板ずれへ1基追加		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・ 防火水槽漏水補修工事（1 m以上の減水） 穴水町字越の原地内、穴水町字上唐川地内、穴水町字曽良地内 工期：R6年3月4日～3月29日 工法：防水シート張り工法 ・ その他、防火水槽補修工法等選定中 未復旧 ・ コンクリート天板ずれ及び外構破損等については、各施工業者と契約が完了、工事着工中。工期完了日R7年3月31日予定。 ①昭和建設株式会社 工事場所：下唐川地区外 請負額：6,531,800円 契約日：令和6年8月23日（随意契約）完了：令和6年11月15日 ②株式会社摩郷 工事場所：丸山地内 請負額：132,000円 契約日：令和6年8月30日（随意契約）完了：令和6年9月12日 ③株式会社東井組 工事場所：沖波地区 請負額：605,000円 契約日：令和6年9月10日（随意契約）完了：令和6年12月11日 ④藏谷工務店株式会社 工事場所：旭ヶ丘地区外 請負額：1,153,000円 契約日：令和6年9月27日（随意契約）完了：令和7年1月31日 ⑤昭和建設株式会社 工事場所：川島地区 請負額：1,632,400円 契約日：令和6年12月13日（随意契約）完了：令和7年3月31日 ・ 防火水槽漏水箇所補修工法等選定完了。他の復旧工事等で本業務に対応できる業者の選定が困難な状態。		
写真	撮影日時	令和6年1月中旬	
			
