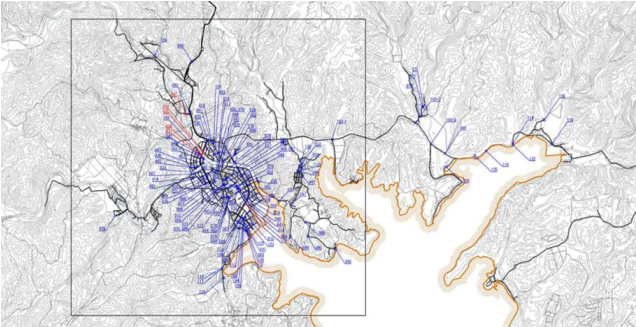


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町上水道施設		
位置図	地番	穴水管内	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	3,100,000,000	円
	・浄水場N=2箇所、ポンプ場N=11箇所、水道管L=138km ・上野浄水場及び宇留地浄水場が震災により稼働停止（停電の影響による） ・上野浄水場においては、自家用発電機の循環水が断水であることから稼働不可となる。 ・上野浄水場導水路が大規模山腹崩壊により埋没し、取水不可となる。 ・送水管・配水管・給水管（町管理の1次側）において270箇所が被災。 ・上野水管橋(φ500mm)より漏水がある。 ・穴水町上水道区域全域で断水となった。 ・能登空港配水池管理道路(徒歩にて配水池への通行は可能)【R6.9.22豪雨災害】		
被害状況詳細	・水道管（送水管・配水管・給水管、漏水調査、応急復旧） N=415箇所 ・水管橋及び橋梁添架配水管(φ500mm～φ50mm) N=14箇所 ・上野浄水場 導水路（仮設ポンプにて緊急で取水） ・上野浄水場管理棟（天井・床・壁） N=一式 ・上野浄水場管理棟（照明設備） N=一式 ・能登空港配水池管理道路(L=36m)が崩落【R6.9.22豪雨災害】		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	・応急復旧工事完了済み（N=270箇所）（復旧期間：R6年1月9日～3月2日） ・上野浄水場内の配水本管（φ500mm）の仮設及び本復旧は完了済み。（4月23日～6月17日） ・水管橋及び橋梁添架配水管(φ500mm～φ50mm) 仮配管済N=6箇所(1箇所は止水中) ・上野浄水場及び宇留地浄水場の復旧工事完了(6月17日～12月20日) ・各ポンプ場付帯施設（コンクリート構造物・門扉・フェンス等）の復旧工事完了(6月17日～9月30日) ・その他、公共下水道災害と併せて耐震管（GX管）を整備し、耐震化を促進する		
写真	撮影日時	令6年9月30日	
		
