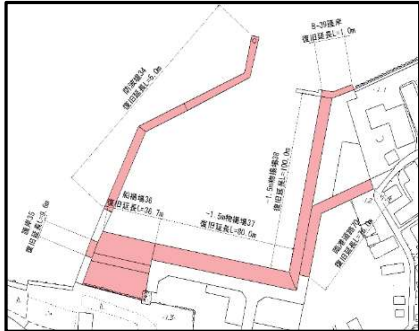


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	新崎漁港		
位置図	地番	新崎地先	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	919,000,000	円
	防波堤上部工の破断 船揚場の舗装版の沈下、ズレ、臨港道路の沈下、亀裂 物揚場エプロンの沈下、亀裂及び護岸の傾斜 護岸の水叩工の沈下及び上部工の破断		
被害状況詳細	復旧延長 L = 39.2m 39防波堤(その1)、34-4防波堤(その2)、34-1防波堤(その1) 復旧延長 L = 316.1m -1.5m物揚場38、船揚場B36、-1.5m物揚場37、臨港道路70、護岸B35		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	3月27日災害査定実施 工事発注まで危険箇所はバリケード設置中 (防波堤)(34)破断した上部工を部分的に打ち替える。 (船揚場)(36)被災箇所の舗装版を更新する。先端止壁のズレは実施設計時の横断測量で確認。 (臨港道路)(70)被災箇所の舗装及び側溝を更新する。 (物揚場)(37)(38)被災したエプロンを更新する。(38)の護岸の傾きは実施設計時に検討。 (護岸)(35)沈下した水叩きを打ち替える。(B-39)破断した上部工を部分的に打ち替える。		
写真	撮影日時		
			
